ボーリング柱状図

調　査　名　[redacted]

事業・工事名

ボーリングNo.

シートNo.

ボーリング名	No.3	調査位置								北緯	37° 9′ 58.8″
発注機関	株式会社高舘組			調査期間	令和 4年 5月 10日 ～ 4年 月 日					東経	138° 12′ 47.8″
調査業者名	株式会社新研基礎コンサルタント 電話（025-286-7188）	主任技師	山本 毅	現場代理人	青木 貴幸	コア鑑定者				ボーリング責任者	内山 功夫
孔口標高	H=31.646m	角度	180° 上 90° 下 0° 0°	方向	北 0° 270° 西 90° 東 180° 南	地盤勾配	鉛直 90° 水平0°	使用機種	試錐機	ハンマー落下用具	半自動落下装置
総掘進長	25.45m								エンジン	ポンプ	

標尺 (m)	標高 (m)	層厚 (m)	深度 (m)	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記事
	31.56	0.15	0.15		砂質粘土				
1					シルト質細砂				
2									
3									
4									
	26.90	4.60	4.75						
5					シルト混じり細砂				
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
	17.90	9.00	13.75						
14					シルト質細砂				
15									
16									
17									
	13.90	4.00	17.75						
18					シルト混じり細砂				
19									
20									
21									
	9.60	4.30	22.05						
22					シルト質細砂				
	8.90	0.70	22.75						
23					シルト混じり細砂				
24									
25									
	6.20	2.70	25.45						

孔内水位(m)／測定月日：5/11 0.51

標準貫入試験

深度 (m)	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量(cm)	N値
1.15	4	9	12	25/30	25
2.15	8	6	11	25/30	25
3.15	16	20	24/8	60/28	64.3
4.15	13	16	21	50/30	50
5.15	14	19	26	59/30	59
6.15	16	19	20	55/30	55
7.15	14	19	22	55/30	55
8.15	16	21	23/7	60/27	66.7
9.15	12	11	13	36/30	36
10.15	8	19	22	49/30	49
11.15	12	16	19	47/30	47
12.15	13	16	21	50/30	50
13.15	10	12	14	36/30	36
14.15	20	35	5/2	60/22	81.8
15.15	19	21	20/5	60/25	72.0
16.15	17	21	22/6	60/26	69.2
17.15	17	22	21/5	60/25	72.0
18.15	12	16	16	44/30	44
19.15	13	16	20	49/30	49
20.15	12	16	22	50/30	50
21.15	12	16	21	49/30	49
22.15	14	19	27	60/30	60
23.15	16	20	24/8	60/28	64.3
24.15	16	21	23/8	60/28	64.3
25.15	17	23	20/6	60/26	69.2

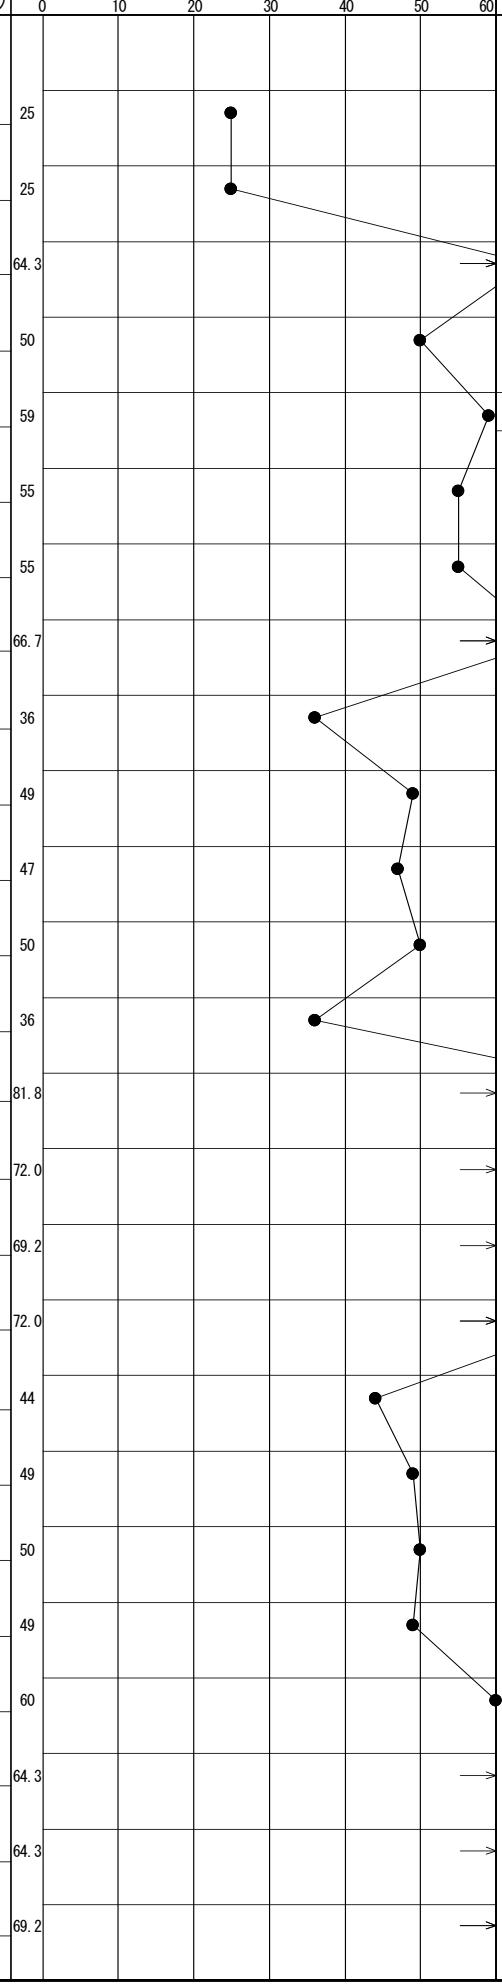

原位置試験

深度 (m)	試験名および結果
5.00	現場透水試験
5.50	

試料採取

深度 (m)	試料番号	採取方法

室内試験（　）

掘進月日：5/11
